



Holtaskóli


Endurbætur

REYKJANESBÆR



Verkstaða 19.12.2023

1. áfangi U og Y Álma

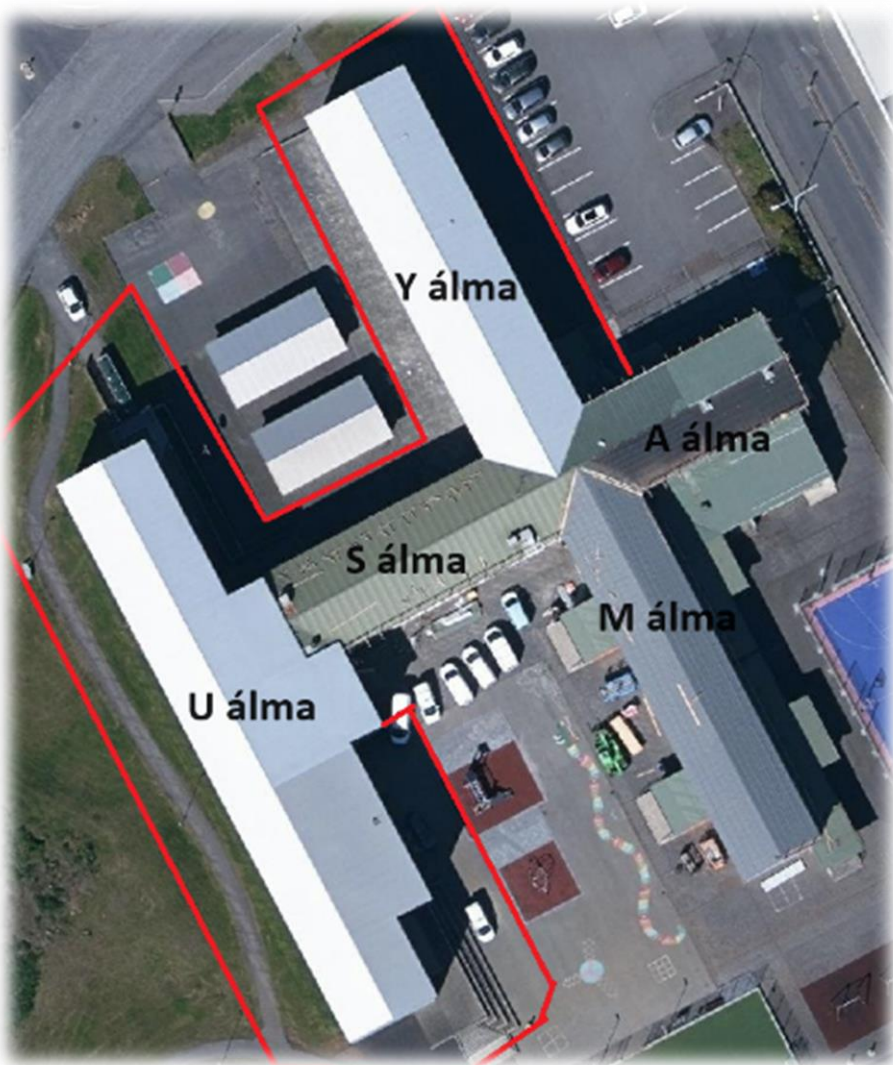

Verkstaða og næstu verk - rif innandyra

- Öllu asbest hreinsun lokið og úttekið í U álmum
- Búið að rífa öll stærstan hluta af léttum veggjum hurðum, gólfefni og loft álmum U og Y, restin af léttum veggjum og glerveggjum klárast fyrir áramót og byrjað verður á útveggjaklæðingu í kjölfarið
- Búið er að fjarlægja allar raflagnir í útveggjum og í gólfi smíðastofu, vinnulýsing komin upp og vinnutenglar við töflu 1.hæð og 2.hæð fyrir hitablásara. Smá drasl eftir okkur sem við fjarlægjum í dag. Efni í járntöflu í smíðastofu fjarlæggt.
- Bætt verður við vinnutöflur / vinnutengla ef þörf er á ljós í stofum eru kveikt í töflu á viðkomandi hæð. Sér gr. Fyrir herbergi .
- U og Y álma verður keyrð á hita á ofnum þar til rif á útveggjum byrjar, er byrjað að útbúa þannig að hægt að tengja öfluga blásara með litlum fyrirvara og loka af ofna.
- Verkið að klára aftengja neysluvatn og aftengja ofan í U álmum
- Búið að grafa fyrir drenlagn ofan við U álmum og næstu verk
- Búið að koma hita á A og M álmum aftur og rif í þessum álmum komið vel á veg


Hönnun og útboð áfangi nr 1 – verkstaða og næstu verk

- Byggingarnefndarteikningar eru langt komnar og verða skilaðar inn til byggingafulltrúa eftir áramót
- Búið að setja í vinnslu hönnun á þakeiningum og lausnir tengt því
- Búið að setja í útboð utanhússklæðing og gluggaskipti 1. áfanga og áætlað að opna útboðið 4. janúar 2024 og byrja ekki seinna en 1. febrúar
- Verðkönnun vegna sögun og kjarnaborun 1. áfanga út í vikunni
- Byrjað að vinna útboðs og hönnunargögn innandyra vegna 1. áfanga og verða innanhúsfrágangur boðin út í janúar 2024 og ætti að gera byrjað á uppbyggingu innandyra í febrúar og mars 2024

Verkmyndir



Verkmyndir

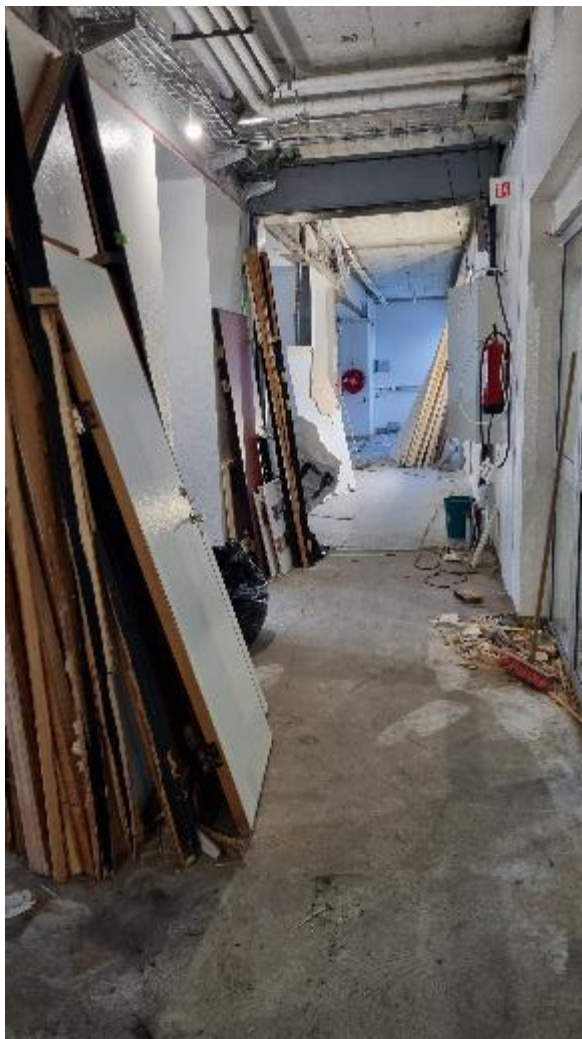

Verkmyndir

