



REYKJANESBÆR

Myllubakkaskóli

Endurbætur



Verkstaða 19.12.2023

OMR verkfræðistofa ehf

D álma - Verkstaða og næstu verk

- Búið að setja stofnstokka fyrir almennt loftræstikerfi, Samstæður komnar inn í hús
- Airmaster er komið upp á 1. hæð. 2hæð hálfnuð.
- Langir að mestu komnar – eftir að tengja í hreinlætistæki
- Innréttingasmíði er á fullu og búið að setja saman mikið af skápum
- Langt komið að spónleggja fyrir vikulok
- Vonast eftir fyrstu innréttingar fari upp á næstu dögum – verið að pressa á að fari upp sem fyrst
- Byrjað á hurðasmíði í næstu viku hjá verkstæði
- Innréttingasmíði er á fullu og búið að setja saman mikið af skápum
- Byrjað verður að spónleggja fyrir vikulok
- Áætlað að setja upp fyrstu innréttingar 4. des
- Byrjað á hurðasmíði í næstu viku hjá verkstæði
- Flísalögn komið á 1. Hæð. Verið að leggja lokahönd á 2.hæð.
- Bekkir og fl ágöngum tilbúið undir teppi og bólstrun.
- Þakeiningar komnar á lyftuhús. Verið að bræða pappa.
- Flasningar og leiðarar að miklu leiti klárir á tvær hliðar.
-

D álma - Verkstaða og næstu verk

- Byrjað að grinda fyrir timburklædda veggj á 1.hæð
- Undirkerfi fyrir loftaplötur klárt á 2.hæð
- Leiðarar og upphengjur klárt fyrir kerfisloft. Plötur fara í þegar búið að þrifa.
- Rafmagnstöflur komnar í hús
- Búið að leggja dren og regnvatn meðfram lyftuhúsi.
- Búið að leggja skólþ í kjallara D
- Búið að sprauta hljóðeinangrun á 2.hæð. allt nema stigahús. Byrja setja upp loftaplötur 2.hæð

D álma - Verkstaða og næstu verk

Næstu verk:

- Setja upp glerveggi og hurðar
- Setja upp innréttingar.
- Halda áfram að grindu og einangra fyrir timburklæddum veggjum á 1.hæð
- Halda áfram að draga út og tengja rafmagn.
- Steypa yfir skólp í kjallara D
- Undirvinna og mála á 2.hæð.
- Halda áfram að setja upp loftræsisamstæður á 2.hæð
- Halda áfram með klæðningu að utan
- Halda áfram að rífa úr úr A-álmum

A álma - Verkstaða og næstu verk

- Búi að rífa alla létta veggj
- Búið rífa öll loft og loftaefni
- Búið að rífa alla ofna, lagnir og raflagnir
- Langt komið að taka af öll teppi (gólfefni)
- Verið að koma öllu ofangreindu í gáma
- Búið að rífa niður 50% niður gömlu utanhúsklæðingu sem snýr að Hringbraut
- Búið að opna og laga veg fyrir nýjan verktakainngang frá Norðurtúni
- Næstu verk:
 - að klára rífa útveggjaklæðingu að utan
 - að er rífa útveggjaklæðingu að innan
 - Saga niður steinveggi og opnanir samanber nýtt skipulag

Verkmyndir – D álma



Verkmyndir – D álma




Verkmyndir – D álma



Verkmyndir – D álma



Verkmyndir – D álma

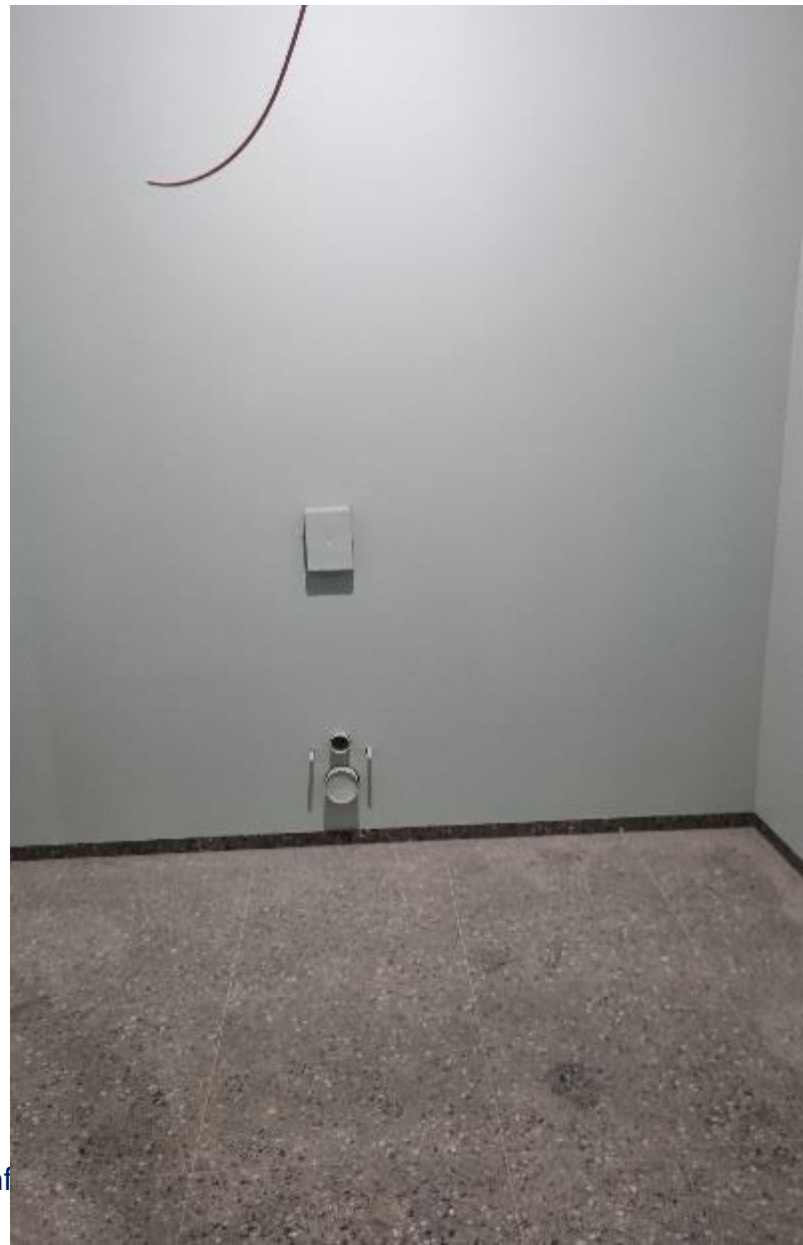

ehf

Verkmyndir A álma



Verkmyndir A álma



Verkmyndir A álma



ehf
